ÉCHÉANCIER DE MISE HORS SERVICE DÉFINITIVE
(à la cessation de l'exploitation)

EN RÉPONSE À L'ENGAGEMENT NO.6 DÉCOULANT DE LA SÉANCE DE TRAVAIL DU 15 MAI 2019

PROJET DE CONSTRUCTION DE PIPELINE INTRAGAZ 2019
ÉCHÉANCIER DE MISE HORS SERVICE DÉFINITIVE
(À LA CESSATION DE L'EXPLOITATION)

ID		Task Mode	Task Name	Duration
1			**PLAN D'ABANDON**	**5 days**
2			Établir le motif	1 day
3			Consultation avec propriétaire	3 days
4			Évaluer les incidences	5 days
5			Évaluer les risques éventuels	5 days
6			Procédure détaillée	5 days
7			Rédaction du Plan d'abandon	5 days
8			**AVIS AU MERN & MELCC**	0 days
9			**TRAVAUX TERRAINS**	**22 days**
10			Localisation & marquage	2 days
11			Évacuation des fluides résiduels	1 day
12			Purge des conduites	1 day
13			Excavation des points de coupe (2 par conduite)	2 days
14			Coupe et obturation des conduites	2 days
15			Remblayage des points de coupe (2 par conduite)	2 days
16			Enlèvement des sections de tuyauterie hors sol	2 days
17			Enlèvement des autres matériaux connexes en surface	2 days
18			Caractérisation du sol & analyse (si requis)	8 days
19			Décontamination (si requis)	3 days
20			**RAPPORTS**	**11 days**
21			Rapport de caractérisation (si requis)	5 days
22			Registre de conduites abandonnées (mise à jour)	2 days
23			Rapport au MERN et MELCC	5 days

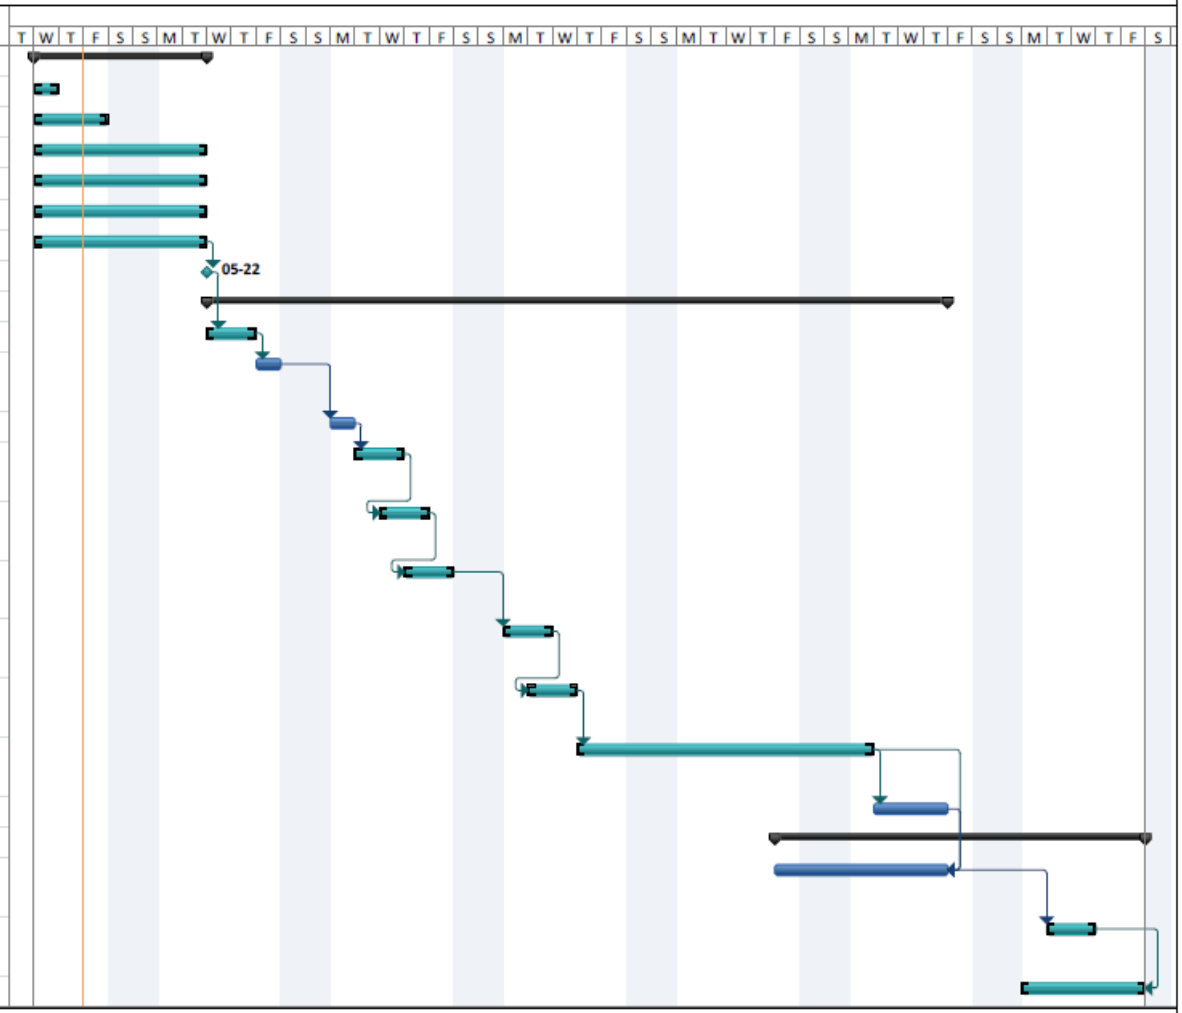

Project: Plan d'abandon pipeline P
Date: Fri 19-05-17

Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only
Split	External Milestone	Duration-only	Deadline
Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress
Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	
Project Summary	Inactive Summary	Start-only	
